
5410 Sambýli til menningartarna á Mýruni

Id	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato	Foregående opgaver
1	**Sambýli til fólk við menningartarni - Mý**	**1118 dage**	**ti 06.03.18**	**on 12.10.22**	
2	**Byggiskrá**	**59 dage**	**ti 06.03.18**	**fr 25.05.18**	
3	Fundarvirksemi og orðing	59 dage	ti 06.03.18	fr 25.05.18	
4	Handan av byggiskrá	1 dag	ti 06.03.18	ti 06.03.18	
5	**Ráðgeving/projektering**	**774 dage**	**ti 06.03.18**	**ma 05.04.21**	
6	**Útboð - Ráðgeving**	**70 dage**	**ti 06.03.18**	**ma 11.06.18**	
7	Útbjóðing heildarráðgeving - undangóðkenning	16 dage	ti 06.03.18	ti 27.03.18	
8	Avlevering	0 dage	ti 06.03.18	ti 06.03.18	
9	Døming av undangóðkenning	10 dage	on 28.03.18	ti 10.04.18	7
10	Kunningarskriv til fyritøkur	1 dag	on 11.04.18	on 11.04.18	9
11	Útbjóðing heildarráðgeving - alment útboð við undangóðkenning	21 dage	to 12.04.18	to 10.05.18	10
12	Avlevering	0 dage	ti 06.03.18	ti 06.03.18	
13	Døming av innkomnum tilboðum	10 dage	fr 11.05.18	to 24.05.18	11
14	Sáttmálasamráðingar	12 dage	fr 25.05.18	ma 11.06.18	13
15	**Skipanaruppskot**	**72 dage**	**ti 12.06.18**	**on 19.09.18**	
16	Skipanaruppskot	67 dage	ti 12.06.18	on 12.09.18	14
17	Gransking av skipanaruppskoti	5 dage	to 13.09.18	on 19.09.18	16
18	**Projektuppskot**	**45 dage**	**ma 18.05.20**	**fr 17.07.20**	
19	Projektuppskot	40 dage	ma 18.05.20	fr 10.07.20	17
20	Útbjóðingartilfar til jørðarbeiðið	40 dage	ma 18.05.20	fr 10.07.20	
21	Gransking av prosjektuppskoti	5 dage	ma 13.07.20	fr 17.07.20	19
22	**Mynduleikaprojekt**	**30 dage**	**on 04.11.20**	**ti 15.12.20**	
23	Mynduleikaprojekt	15 dage	on 04.11.20	ti 24.11.20	
24	Mynduleikaviðgerð	15 dage	on 25.11.20	ti 15.12.20	23
25	**Høvuðsprojekt**	**55 dage**	**on 16.12.20**	**ti 16.03.21**	
26	Høvuðsprojekt	35 dage	on 16.12.20	ti 16.02.21	24
27	Gransking av høvuðsprojekti	20 dage	on 17.02.21	ti 16.03.21	26
28	**Útboð - Jørðarbeiðið**	**17 dage**	**on 16.12.20**	**to 21.01.21**	
29	Útboð	15 dage	on 16.12.20	ti 19.01.21	24
30	Licitatión	1 dag	on 20.01.21	on 20.01.21	29
31	Sáttmáli	1 dag	to 21.01.21	to 21.01.21	30
32	**jørðarbeiðið**	**52 dage**	**fr 22.01.21**	**ma 05.04.21**	
33	uppstartur	1 dag	fr 22.01.21	fr 22.01.21	31
34	Grovplanering	50 dage	ma 25.01.21	fr 02.04.21	33
35	Avhanda jørðarbeiðið	1 dag	ma 05.04.21	ma 05.04.21	34
36	**Útboð - Høvuðsarbeiðstøka**	**66 dage**	**on 17.03.21**	**on 16.06.21**	
37	Klárgerð av útbjóðingartilfari	10 dage	on 17.03.21	ti 30.03.21	27
38	Útboð	21 dage	on 31.03.21	on 28.04.21	37
39	Licitatión	0 dage	on 28.04.21	on 28.04.21	38
40	Gransking av tilboðum	10 dage	to 29.04.21	on 12.05.21	39
41	Sáttmálasamráðingar	10 dage	to 13.05.21	on 26.05.21	40
42	prosjektgjøgnumgongd	15 dage	to 27.05.21	on 16.06.21	41
43	**Innbúgv og tól**	**309 dage**	**ma 05.10.20**	**ma 07.02.22**	
44	Prosjetering innbúgv og tól	35 dage	ma 05.10.20	fr 20.11.20	
45	Útboð innbúgv og tól	20 dage	ti 04.01.22	ma 31.01.22	
46	Lisitatión innbúgv og tól	1 dag	ma 07.02.22	ma 07.02.22	
47	**Bygging**	**282 dage**	**to 17.06.21**	**on 28.09.22**	
48	Uppstartur	1 dag	to 17.06.21	to 17.06.21	42
49	Bygging	280 dage	fr 18.06.21	ti 27.09.22	48
50	Avlevering	1 dag	on 28.09.22	on 28.09.22	49
51	Mangulgjøgnumgongd	10 dage	to 29.09.22	on 12.10.22	50

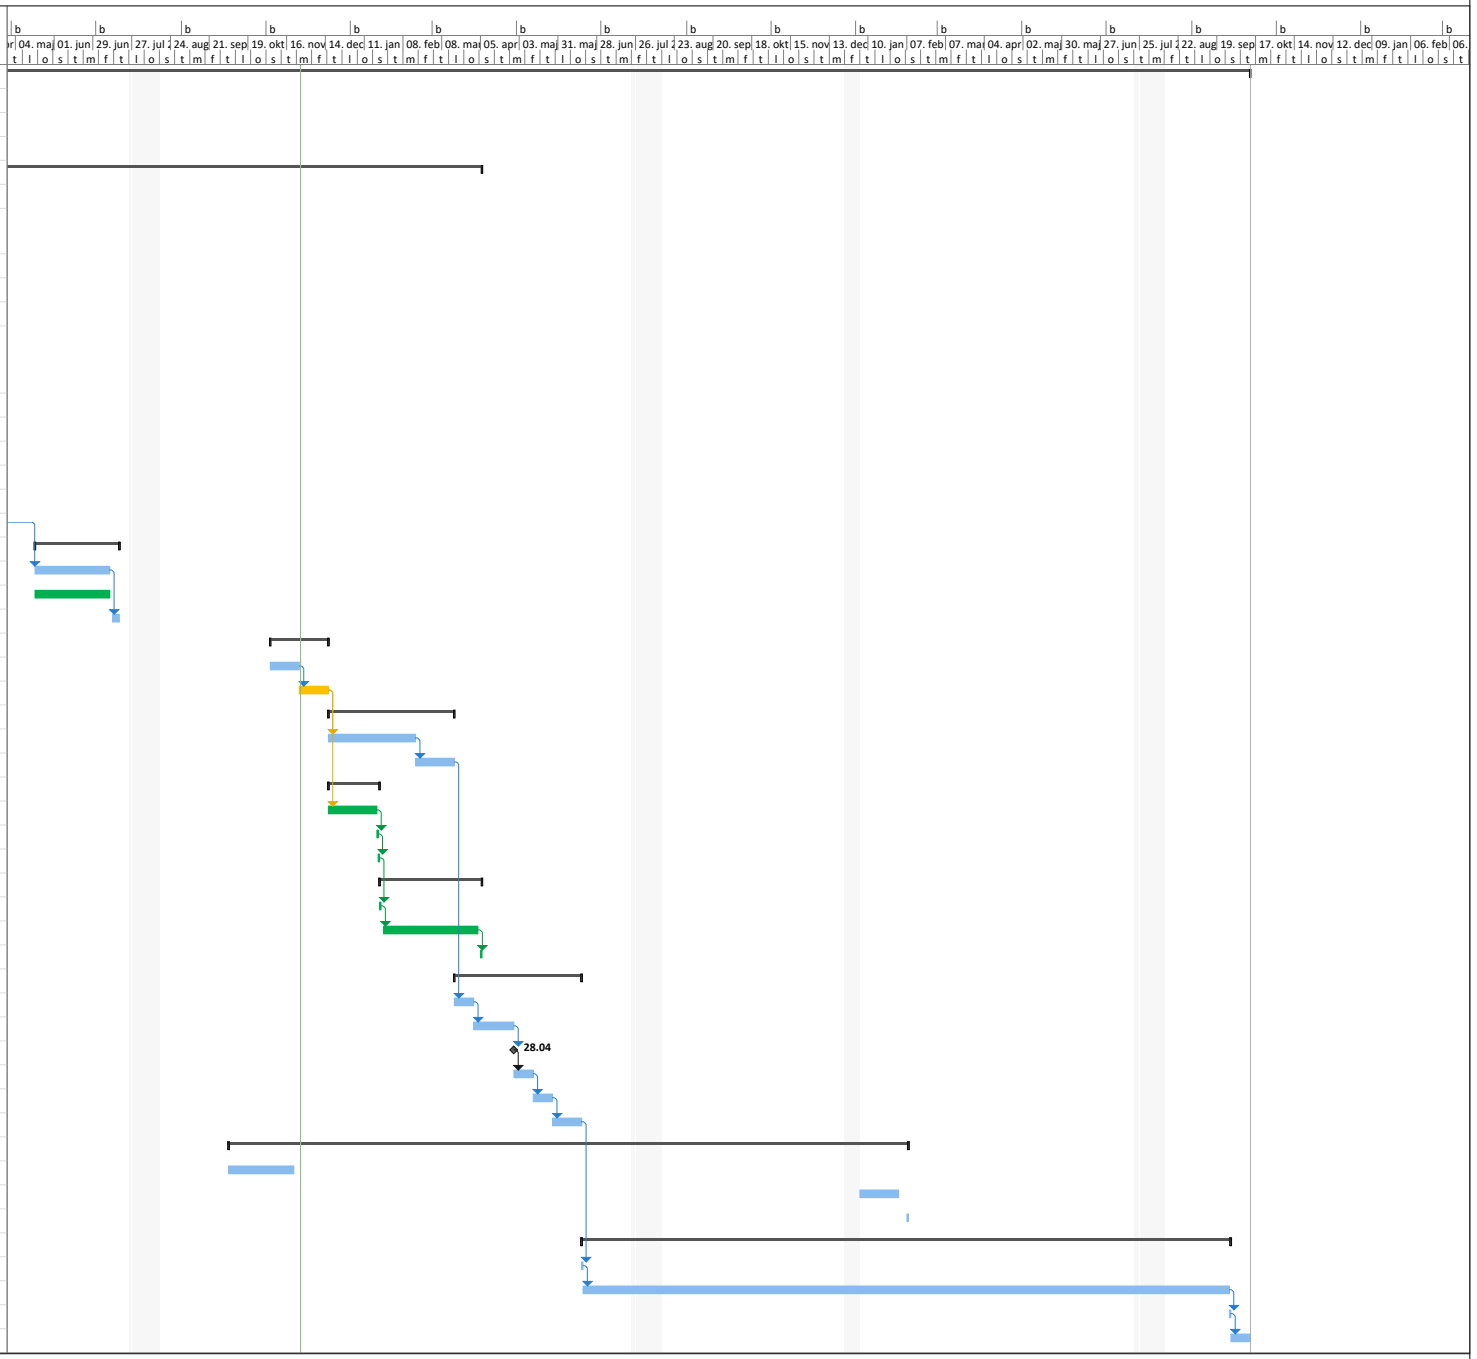

LM-063/2020
