
Rev. Fri 05/12/25

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1		**LSH H-bygn: Renovering av útsíðum**	**273 days**	**Wed 15/10/25**	**Tue 15/12/26**
2		**Hædd 2**	**144 days**	**Wed 15/10/25**	**Fri 22/05/26**
3		**Fasa 1**	**48 days**	**Wed 15/10/25**	**Fri 19/12/25**
4		Norðursíða (13 stk.)	27 days	Wed 15/10/25	Thu 20/11/25
5		Eystursíða (10 stk.)	21 days	Fri 21/11/25	Fri 19/12/25
6		**Fasa 2**	**42 days**	**Mon 05/01/26**	**Tue 03/03/26**
7		Eystursíða (10 stk.)	21 days	Mon 05/01/26	Mon 02/02/26
8		Suðursíða (4 stk.)	8 days	Tue 03/02/26	Thu 12/02/26
9		Suðursíða (PSYK 6 stk.)	13 days	Fri 13/02/26	Tue 03/03/26
10		**Fasa 3**	**54 days**	**Wed 04/03/26**	**Fri 22/05/26**
11		Suðursíða (PSYK 4 stk.)	8 days	Wed 04/03/26	Fri 13/03/26
12		Suðursíða (4 stk.)	8 days	Mon 16/03/26	Wed 25/03/26
13		Vestursíða (18 stk)	38 days	Thu 26/03/26	Fri 22/05/26
14					
15		**Hædd 1**	**129 days**	**Tue 26/05/26**	**Tue 15/12/26**
16		**Fasa 1**	**40 days**	**Tue 26/05/26**	**Mon 20/07/26**
17		Norðursíða (11 stk.)	21 days	Tue 26/05/26	Tue 23/06/26
18		Eystursíða (10 stk.)	19 days	Wed 24/06/26	Mon 20/07/26
19		**Fasa 2**	**39 days**	**Tue 21/07/26**	**Tue 06/10/26**
20		Eystursíða (10 stk.)	19 days	Tue 21/07/26	Tue 08/09/26
21		Suðursíða (4 stk.)	8 days	Wed 09/09/26	Fri 18/09/26
22		Suðursíða (PSYK 6 stk.)	12 days	Mon 21/09/26	Tue 06/10/26
23		**Fasa 3**	**50 days**	**Wed 07/10/26**	**Tue 15/12/26**
24		Suðursíða (PSYK 4 stk.)	8 days	Wed 07/10/26	Fri 16/10/26
25		Suðursíða (4 stk.)	8 days	Mon 19/10/26	Wed 28/10/26
26		Vestursíða (18 stk)	34 days	Thu 29/10/26	Tue 15/12/26
27					
28		**Hædd 0**	**199 days**	**Mon 17/11/25**	**Mon 05/10/26**
29		**Fasa 1**	24 days	Mon 17/11/25	Thu 18/12/25
30		Norðursíða (8 stk.)	14 days	Mon 17/11/25	Thu 04/12/25
31		Eystursíða (6 stk.)	11 days	Fri 05/12/25	Fri 19/12/25
32		**Fasa 2**	23 days	Mon 05/01/26	Wed 04/02/26
33		Eystursíða (11 stk.)	19 days	Mon 05/01/26	Thu 29/01/26
34		Suðursíða (2 stk.)	4 days	Fri 30/01/26	Wed 04/02/26
35		**Fasa 3**	41 days	Thu 16/07/26	Mon 05/10/26
36		Psyk. garðurin 21 stk.	41 days	Thu 16/07/26	Mon 05/10/26
37		**Fasa 4**	**32 days**	**Thu 05/02/26**	**Fri 20/03/26**
38		Vestursíða (18 stk)	32 days	Thu 05/02/26	Fri 20/03/26
39					
40		**Hædd -1**	**154 days**	**Mon 23/03/26**	**Mon 23/11/26**
41		**Fasa 1**	24 days	Mon 23/03/26	Tue 28/04/26
42		Norðursíða (9 stk.)	14 days	Mon 23/03/26	Tue 14/04/26
43		Eystursíða (6 stk.)	10 days	Wed 15/04/26	Tue 28/04/26
44		**Fasa 2**	22 days	Wed 29/04/26	Mon 01/06/26
45		Eystursíða (11 stk.)	18 days	Wed 29/04/26	Tue 26/05/26
46		Suðursíða (2 stk.)	4 days	Wed 27/05/26	Mon 01/06/26
47		**Fasa 3**	35 days	Tue 06/10/26	Mon 23/11/26
48		Psyk. garðurin 21 stk.	35 days	Tue 06/10/26	Mon 23/11/26
49		**Fasa 4**	**32 days**	**Tue 02/06/26**	**Wed 15/07/26**
50		Vestursíða (18 stk)	32 days	Tue 02/06/26	Wed 15/07/26
51					
52		**Hædd -2**	**60 days**	**Tue 01/09/26**	**Mon 23/11/26**
53		Ymiskir lekar á H-2	60 days	Tue 01/09/26	Mon 23/11/26
54					
55		**Hædd 3**	**3 days**	**Tue 01/09/26**	**Thu 03/09/26**
56		Leki í takvindeyga	3 days	Tue 01/09/26	Thu 03/09/26
57					
58		**Úthurðar**	**145 days**	**Mon 26/01/26**	**Tue 15/09/26**
59		Prosjekt	15 days	Mon 26/01/26	Fri 13/02/26
60		Útboð	10 days	Mon 16/02/26	Fri 27/02/26
61		Útskifting (22 hurðar)	60 days	Mon 01/06/26	Tue 15/09/26
62					
63		**Kanning og ábøtur á múrkrúnu**	100 days	Mon 18/05/26	Wed 28/10/26
64					
65		**Avleidd arbeiðir**	230 days	Mon 24/11/25	Tue 24/11/26
66					

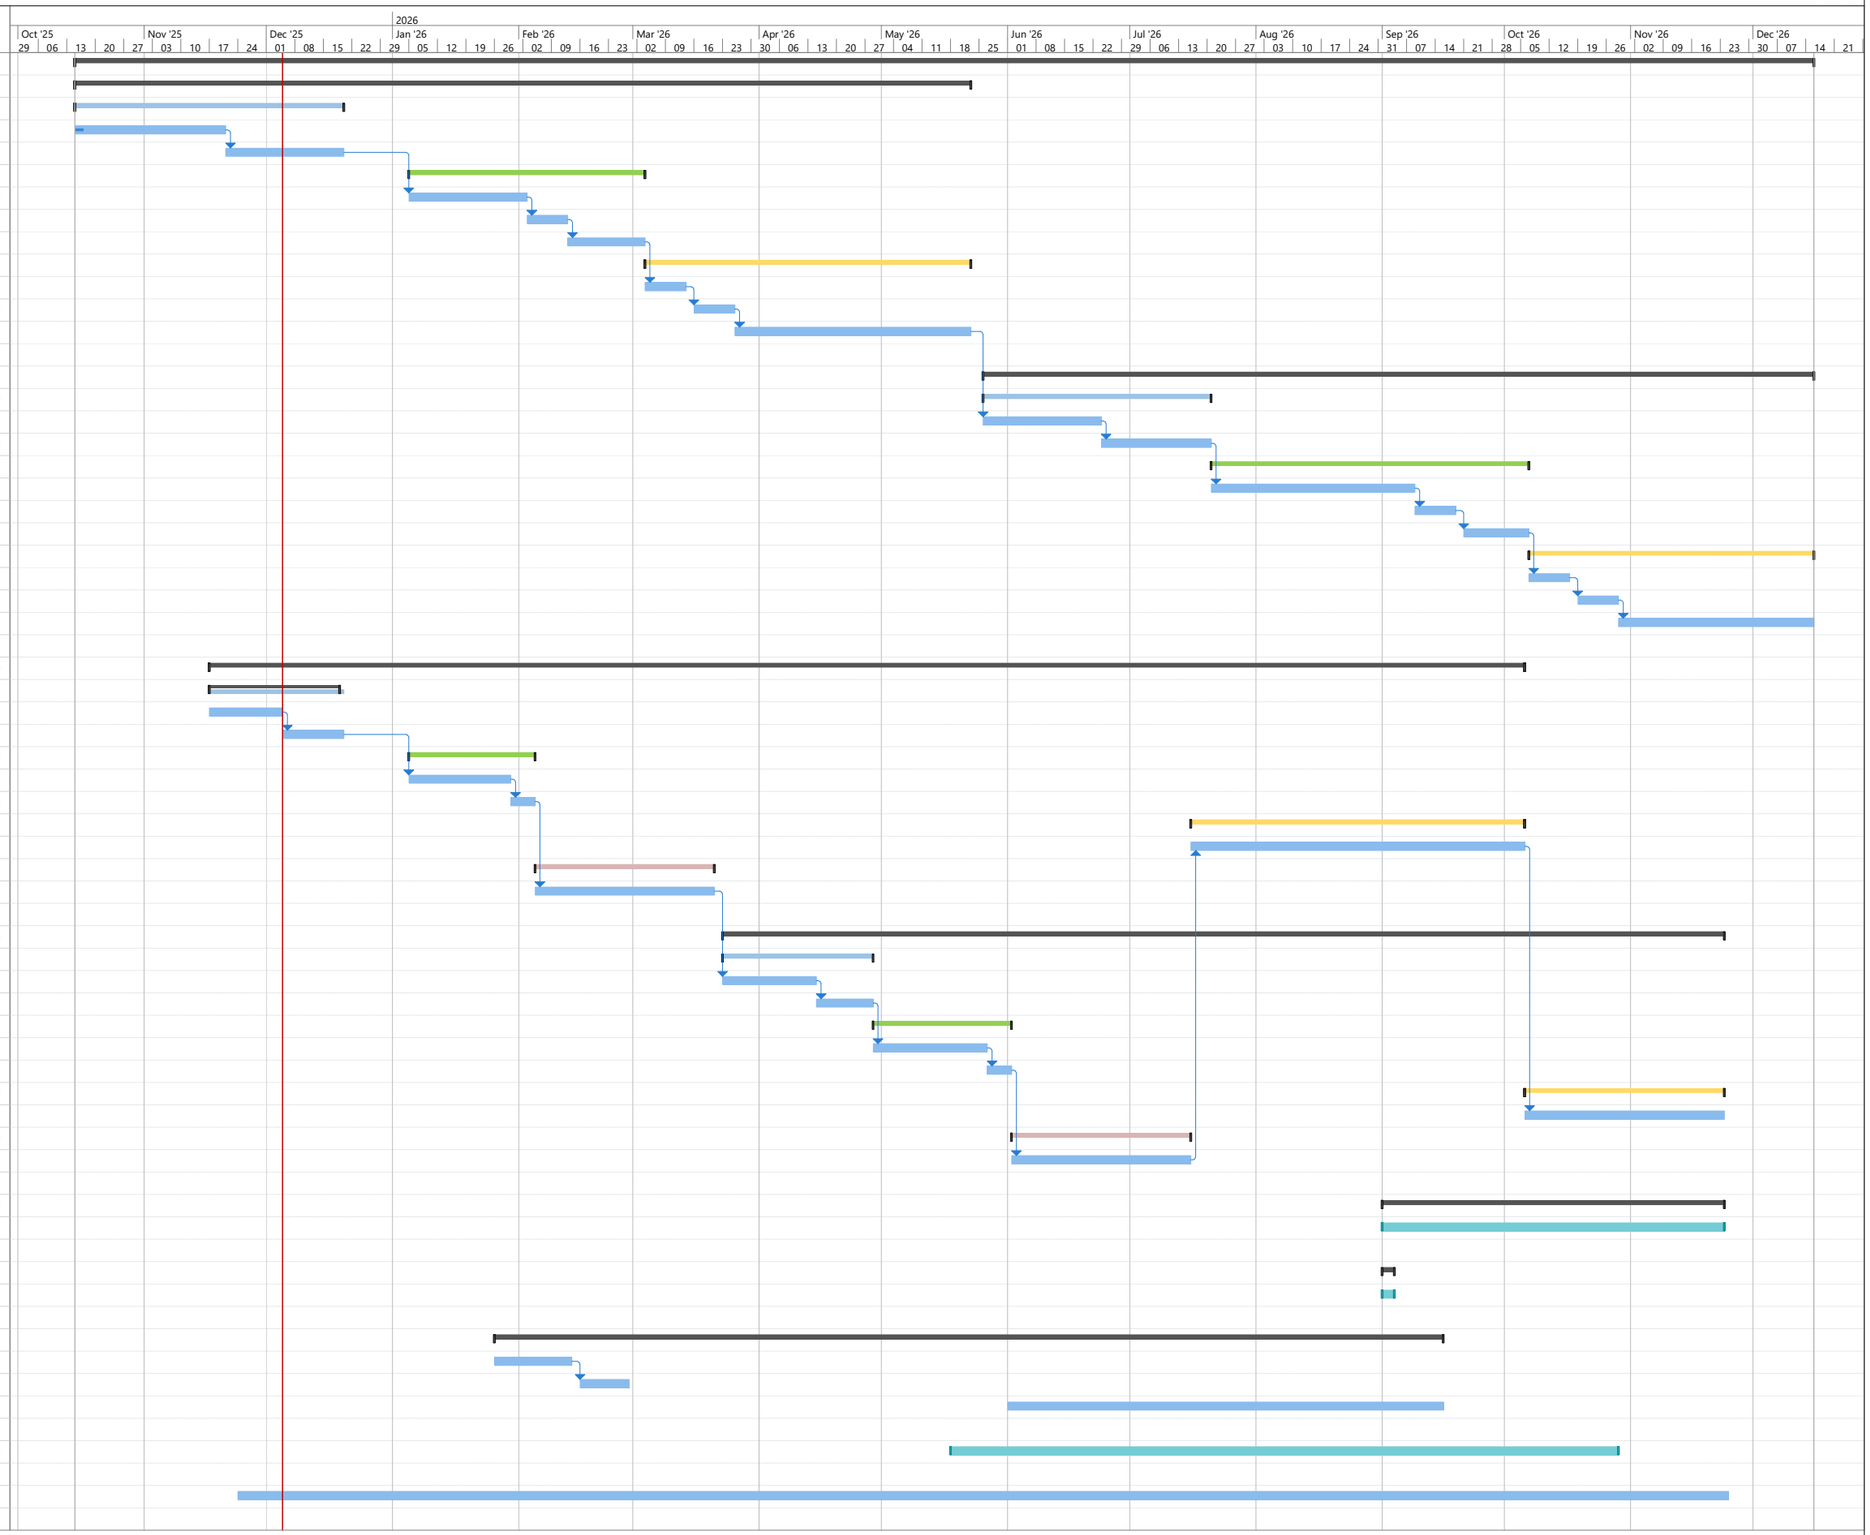

Project:
LSH H-bygningur - Renovering av útsíðum
Date: 17.10.2025

Task · Split · Milestone · Summary · Project Summary · Inactive Task · Inactive Milestone · Inactive Summary · Manual Task · Duration-only · Manual Summary Rollup · Manual Summary · Start-only · Finish-only · External Tasks · External Milestone · Deadline · Progress · Manual Progress
